

SZÉCHENYI 2020



Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség

h 7 964(1)

52-2015-0127

ERKEZETT
2015 MÁJ 19.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

„Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon”

Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010





Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a **Nemzetgazdasági Minisztérium** (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím:	7621 Pécs, Mária u. 3.
Székhely:	7621 Pécs, Mária u. 3.
Aláírásra jogosult képviselője:	dr. Sitányi László, ügyvezető
Azonosító szám	
(törzs-szám/Cégjegyzékszám):	02-09-073171
Adószám:	20145103-2-02

másrésről **SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím:	7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Pf. 1.
Székhely/Lakcím:	7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 1741. hrsz.
Azonosító szám (törzs-szám):	733568
Adószám/adóazonosító jel:	15733562-2-17
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:	11746005-15416566-11550004
Aláírásra jogosult képviselője:	Ács Rezső, polgármester

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató az Új Széchenyi Terv **Dél-Dunántúli Operatív Program** Operatív Program (a továbbiakban: **DDOP**) keretén belül **Egészségügyi alapellátás fejlesztése tárgyú felhívást** tett közzé, melyre Kedvezményezett **DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010** azonosító számon regisztrált, **2014.07.01.** napon befogadott projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a Támogató 2015.04.15. napon kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt





javaslat/pályázat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

A Szerződés tárgya a „**Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon.**” című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek **az Európai Regionális Fejlesztési Alapból** és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár irányítása alatt működő központi koordinációs szerv 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglalt, a közbeszerzések felügyeletét ellátó egységét bevonja.

2.2. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program DDOP-3.1.3/G-14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: **2015. év 06. hó 15. nap.** Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósítása, lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2015. év 09. hó 30. nap.**

3.3.2. A Projekt megvalósításának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesült és a Kedvezményezett mind az elszámolásra benyújtandó, mind az elszámolásra



Handwritten signature

benyújtásra nem kerülő számlákat, valamint szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.

A Projekt megvalósulásának tervezett napja: **2015. év 09. hó 30. nap.**

3.3.3 Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként, a záró beszámoló benyújtásának határideje:

Támogatási összeg igénylésére irányuló utolsó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje nem lehet későbbi, mint

- a) szállítói finanszírozású számlát is tartalmazó kérelem esetén: 2015. október 31.
- b) 2015. december 31-ig pénzügyileg teljesített, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó kérelem (beleértve az előleg-elszámolást is) esetén a határidő: 2016. január 15.

A záró beszámoló benyújtásának határideje: a Projekt fizikai befejezésétől számított 30. nap, mely a Közreműködő Szervezet engedélyével egy alkalommal maximum 90 napra módosítható, de nem lehet később, mint

- a) számlát is tartalmazó utolsó kifizetési kérelem mellékleteként benyújtott záró beszámoló esetén a fenti a) és b) pontok szerint;
- b) számla nélküli utolsó kifizetési kérelem mellékleteként benyújtott záró beszámoló esetén: 2016. február 15.

3.3.4. A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Közreműködő Szervezet jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

A Projekt befejezésének tervezett napja nem lehet későbbi, mint 2016. június 15.

3.3.5 A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.6 A Projekt keretében a legkésőbb 2015. december 31-ig pénzügyileg teljesített számlával alátámasztott költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható, azok a projekt nem elszámolható költségeinek minősülnek.

3.4. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **7100 Szekszárd, Mikes Kelemen u. 24 3976/2/A/80. hrsz., 3976/1 hrsz., 7100 Szekszárd, Kandó Kálmán u. 10. 818/29/A/1 hrsz., 7100 Szekszárd, Kandó Kálmán u 12. 818/33 hrsz.** (település, utca, házszám, helyrajzi szám) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti.



4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

4.1.1. A Projekt bruttó/nettó összköltsége **43 503 203 Ft**, azaz **negyvenhárommillió-ötszázháromezer-kettőszázhárom forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó/nettó összköltsége **43 503 203 Ft**, azaz **negyvenhárommillió-ötszázháromezer-kettőszázhárom forint**.

A Projekt elszámolható költségeit a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

Ha a Projekt elszámolható összköltsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Ha a Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy – ha az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projektadatlapban meghatározták – bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.

Ha a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, – a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (4) bekezdésében foglalt esetek kivételével – a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 3. melléklete tartalmazza.

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **43 503 203 Ft**, azaz **negyvenhárommillió-ötszázháromezer-kettőszázhárom forint**.

Ha a Szerződés megkötésekor hatályos áfa szabályozás a Szerződés hatálya alatt úgy változik, hogy az áfa-kulcs mértéke nő, a támogatás összege szerződés-módosítás keretében, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint növelhető. Ha az áfa-kulcs mértéke csökken, a támogatás összege is csökken. Ha a Kedvezményezett a Szerződés szerint megillető támogatás az áfa összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.

Az árfolyamváltozással bizonyíthatóan kedvezőtlenül érintett Projekt esetében a támogatás összege szerződés-módosítás keretében növelhető oly módon, hogy a Projekt költségvetésébe – a Támogató





jóváhagyása esetén – árfolyam-kompenzációs tartaléksor kerül beépítésre. Az árfolyam-kompenzációs tartalék felhasználásához a Közreműködő Szervezet jóváhagyása szükséges.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az ÁSZF 3.4.3. pont a) alpontja szerinti kifizetési móddal érintett projektelemekre jutó támogatási összeg legfeljebb **25 %-a**

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **751 320 Ft**, azaz **hétszázötvenegyezer-háromszázhusz forint**.

Az igényelhető fordított ÁFA-előleg legmagasabb összege **0 Ft**, azaz **nulla forint**.

A fordított ÁFA-előleget a Kedvezményezett a folyósítást követő harminc napon belül köteles az adó befizetésére fordítani, kivéve, ha az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény ennél rövidebb határidőt állapít meg, továbbá köteles azzal a befizetését követő öt munkanapon belül a Támogató felé elszámolni.

4.5 Támogatás jogcíme:

2014. július 1-jétől hozott támogatási döntések esetében, a jogcímrendelet(ek) megfelelő módosítást követően:

43 503 203 Ft, azaz **negyvenhárommillió-ötszázháromezer-kettőszázhárom forint**.
nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak,

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott számszerűsíthető eredmények, indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. A Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles.

6. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerint a Szerződés 5. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

Az 5. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, valamint az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

7. Záró rendelkezések

7.1. A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

7.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az



Ues



ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

7.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés 2020. december 31-én hatályát veszti.

7.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

7.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

7.7 „A Kedvezményezett a támogatási szerződésmódosítás aláírásával tudomásul veszi, hogy a Támogató a 2015. október 31-ét követően kifizetési kérelem keretében benyújtott szállítói finanszírozású számlák kiegyenlítésére nem vállal kötelezettséget.

7.8 Az ezen határidőt követően, de a támogatási szerződésben rögzített megvalósítási, illetve legkésőbb a 2015. december 31-i elszámolhatósági határidőt megelőző pénzügyi teljesítésű számlák a Támogató által utófinanszírozási módban kerülnek kifizetésre, amely számlák határidőben történő kiegyenlítése a Kedvezményezett felelőssége. Az utófinanszírozási formában fenti határidőig kiegyenlítésre kerülő számlák kifizetési kérelemben történő benyújtásának véghatárideje: 2016. január 15. Az ezen dátumot követően benyújtott számlák uniós forrásból nem kifizethetőek, a Támogató által automatikusan elutasításra kerülnek.

7.9 A kedvezményezett jelen szerződésmódosítás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésmódosításban szereplő feltételek be nem tartása esetén a projektet egyéb/saját forrásból valósítja meg a szerződésmódosításban meghatározott határidőn belül. Amennyiben a projekt a TSZ 3.3.4. pontjában rögzített befejezés napját követően nem lép fenntartási időszakba, úgy a Támogató a 4/2011. Korm. rendelet 35. § alapján jogosult a támogatási szerződéstől elállni, a Kedvezményezett pedig köteles az igénybe vett támogatásnak az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti ügyleti kamattal növelt összegű visszafizetésére.”


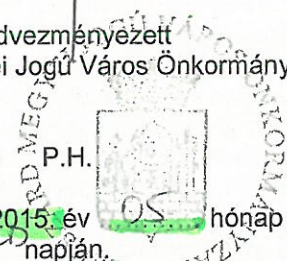



Uts





Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  P.H. Kelt Szekszárd, 2015. év 05. hónap 11. napján.	 Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság P.H. Kelt Pécs, 2015. év 05. hónap 13. napján.
--	---

Melléletek:

1. melléklet- A Projekt elszámolható költségei
2. melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
3. melléklet - A Projekt forrásai
4. melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei
5. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
6. melléklet - Eltérések listája
7. melléklet - A pénzügyi elszámolás részletes szabályai
8. melléklet - Konzorciumi megállapodás- nem releváns
9. melléklet - Közbeszerzési terv
10. melléklet - A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátrix;a Projekt tevékenységeinek ütemezése, a Projekt kifizetési ütemezése)
11. melléklet – Általános Szerződési Feltételek
12. melléklet - Előleg kifizetési kérelem





SZÉCHENYI 2020



Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség

1. melléklet A Projekt elszámolható költségei



MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

1/15



2. melléklet

A Projekt elszámolható költségeinek részletezése



2. melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése

	Projekt előkészítés	Szakmai szolgáltatások	Nyilvánosság biztosítása	Építés (felújítás, bővítés, átalakítás)	Eszközbeszerzés	Összesen
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	0	0	0	40 497 923	0	40 497 923
12.3. Épületek, épületezaki, tulajdoni hányadok	0	0	0	40 497 923	0	40 497 923
14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0
14.1. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	0	0	0
14.3. Irodai, igazgatói, menedzseri és felszerelések	0	0	0	0	0	0
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	1 917 700	870 064	217 516	0	0	3 005 280
52.1. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 917 700	870 064	217 516	0	0	3 005 280
Összesen	1 917 700	870 064	217 516	40 497 923	0	43 503 203

Des

SZÉCHENYI 2020



Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség

3. melléklet A Projekt forrásai



MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

125

3. melléklet - A Projekt forrásai

Forrás	Ft	%
I. saját forrás	0	0,000000%
I./1. a Kedvezményezett hozzájárulása	0	0,000000%
I./2. partnerek hozzájárulása	0	0,000000%
I./3. bankhitel	0	0,000000%
II. egyéb támogatás: ...	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	43 503 203	100,000000%
Összesen	43 503 203	100%

SZÉCHENYI 2020



Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség

4. melléklet A Projekt számszerűsíthető eredményei



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

23

4. sz. melléklet: A Projekt számszerűsíthető eredményei

Eredmény neve	Kulcs-indikátor (I/N)	Mértékegység	Bázis érték	Megvalósulás időszaka		Fenntartási időszak				
				1. év	1. év	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év
Output indikátor										
Beszerzett új, nagyértékű orvosi eszközök műszerek száma	N	db	0	0	0	0	0	0	0	0
Épített, felújított rendelők száma	N	db	0	6	6	6	6	6	6	6
Épített, felújított egyéb helyiségek száma	N	db	0	28	28	28	28	28	28	28
Eredmény indikátor										
Teremtett új munkahelyek száma (Átlagos statisztikai létszámváltozás)	N	fő	0	0	0	0	0	0	0	0
Teremtett munkahelyek száma-nők	N	fő	0	0	0	0	0	0	0	0
A program hatására teremtett főállású új munkahelyeken foglalkoztatott hátrányos helyzetűek száma	N	fő	0	0	0	0	0	0	0	0

Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőségi vállalások

Esélyegyenlőségi intézkedés	Mértékegység	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Célérték (projekt záráskor)	Célérték (projekt fenntartási időszak végén)
1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása	I/N	I	I	I
44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket	I/N	N	I	I

Fenntartható fejlődés

Fenntarthatósági vállalások

Fenntarthatósági szempont	Mérték-egység	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Célérték (projekt záráskor)	Célérték (projekt fenntartási időszak végén)
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés				
1. Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik	I/N	I	I	I
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás				
58. A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma (db)	db	0	1	



5. melléklet
**Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések,
megállapodások**







SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

NYILATKOZAT

Alulírott Ács Rezső polgármester, valamint dr. Göttlinger István aljegyző, mint a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselői nyilatkozunk az „Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon.” című DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010 azonosítószámú projekttel kapcsolatban, hogy a 4/2011. Kormányrendelet 33. § (8) bekezdése alapján biztosíték nyújtása alól mentes SZMJV Önkormányzata.


Ács Rezső polgármester


dr. Göttlinger István aljegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata



Hely: Szekszárd

2015. év május hónap 6. napján.

125

SZÉCHENYI 2020



Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség

6. melléklet Eltérések listája



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

075

Eltérések listája

Projekt azonosító száma:	DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010
Projekt címe:	Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon.
Kedvezményezett neve:	SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett székhelye:	7100, Szekszárd Béla király tér 8.
Aláíráásra jogosult képviselője:	Ács Rezső, polgármester

A Kedvezményezett által benyújtott, **DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010** azonosító számon regisztrált pályázatban és a hozzá kapcsolódó mellékletekben foglaltakhoz képest a projekt az alábbi eltérésekkel valósítandó meg:

I. A Projekt jellemzőit a Támogatási szerződés megkötése előtt érintő eltérések:

1. A támogatói döntés során a projekt összköltsége 8.544.768 forinttal csökkentésre került a következők szerint:

A védőnői szolgálatnak helyt adó ingatlan a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tulajdonában van, amellyel kapcsolatban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata csak bérleti szerződéssel rendelkezik, így az ingatlan nem felel meg a Pályázati Felhívás B pontjának. Ennek következtében a védőnői szolgálatnak tervezett eszközbeszerzés a projektben nem támogatható, így az erre jutó költséggel, 8 076 598 Ft-tal a projekt költségvetését csökkenteni szükséges.

Tekintettel arra, hogy a költségcsökkentés következtében a támogatható összköltség 50 millió Ft alá csökkent, a Könyvvizsgálói díj már nem elszámolható költség, így ennek összegével, 254 000 Ft-tal is csökkenteni szükséges a projekt költségvetését.

A költségcsökkentés következtében a Műszaki ellenőrzés, valamint a Nyilvánosság biztosítása tevékenységekre tervezett összeg meghaladja a Felhívásban előírt korlátot, ezért a Műszaki ellenőrzés tervezett költségét 177 686 Ft-tal, a Nyilvánosságra tervezett költséget pedig 36 484 Ft-tal csökkenteni szükséges. A projekt összköltsége így 43 503 203 Ft lesz.

Az összes költségcsökkentés 8 544 768 Ft. A projekt összköltsége így 43 503 203 Ft lesz.

A projekt az alábbi nem elszámolható tételeket tartalmazza:

- Eszközbeszerzés 8 076 598 Ft
- Műszaki ellenőrzés költségéből 177 686 Ft
- Könyvvizsgálói díj 254 000 Ft
- Nyilvánosság biztosításából 36 484 Ft

2. Projekt tervezett kezdésére és befejezésére vonatkozó eltérések:

Pályázatban megadott dátumok		Tervezett dátumok (Támogatási szerződésben)	
Kezdési időpont	2014.10.01.	Kezdési időpont	2015.06.15
Befejezési időpont	2015.06.30.	Befejezési időpont	2015.09.30
Időtartam	9 hónap	Időtartam	3,5 hónap





3. Indikátorok célértékének változása:

- Az „Épített, felújított rendelők száma” és az „Épített, felújított egyéb helyiségek száma” indikátor értékét szükséges felülvizsgálni, tekintettel arra, hogy az „Épített, felújított rendelők száma” indikátor definíciós adatlapja alapján „Az indikátor értékében külön rendelőnek számítanak a különböző járóbeteg-ellátást nyújtó szakrendelések rendelőhelyiségei és a különálló alapellátáshoz kapcsolódó rendelők”, a projekt keretében pedig 6 alapellátáshoz kapcsolódó rendelő kerül felújításra a benyújtott tervrajzok alapján, míg az „Épített, felújított rendelők” száma indikátor esetében 3 db került feltüntetésre.

- Az E-1 tervlapok alapján az „Épített, felújított egyéb helyiségek száma” 28, míg az indikátortáblában 34 szerepel. Az indikátor értékét a szerződéskötésig felül kell vizsgálni és a támogatási szerződésben már a helyes értéket szükséges szerepeltetni.

A projekt indikátor értékek felülvizsgálatra kerültek az alábbiak alapján:

Indikátor	Pályázatban szereplő érték	Aktuális érték
Épített, felújított rendelők száma	3	6
Épített, felújított egyéb helyiségek száma	34	28

4. Megvalósítási helyszín

Szerződéskötési feltételként szükséges rendezni a projekt fejlesztéssel érintett megvalósítási helyszíneit a pályázónak. Megvalósítási helyszíneként szükséges feltüntetni a rámpa és az akadálymentes parkolók kialakításával érintett helyszíneket is. Továbbá a fejlesztéssel nem érintett 818/29 helyrajzi számú ingatlant szükséges kivenni a megvalósítási helyszínek közül.

Pályázó a pályázati adatlapon rendezte a fejlesztéssel érintett megvalósítási helyszíneket. Alátámasztó dokumentumok: Tulajdoni lapok

5. A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az aláíró/aláírásra jogosult képviselők adatai az alábbiak szerint változnak:

Név: Ács Rezső

Beosztás: polgármester

Telefon: 74/ 412-719

E-mail: polgarmester@szekszard.hu

Név: dr. Haag Éva

Beosztás: alpolgármester

Telefon: 74/ 504-102

Fax: 74/ 412-719

E-mail: dr.haag.eva@szekszard.hu



8/5



6. A projekt adatlap 3.18. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai menüpontban megadott elérhetőségek a következőkre módosulnak:

Név: Szabó Veronika

Beosztás: pályázati referens

Telefon 1: 74/ 504-168

Telefon 2: 30/494-8028

Fax: 74/510-251

E-mail: szabo.veronika@szekszard.hu

7. A projekt pénzforgalmi számlaszáma az alábbiak szerint módosul:

Régi számlaszám: 11746005- 15416566- 00000000

Új számlaszám: 11746005- 15416566- 11550004

A projekt minden egyéb adata változatlan marad.

Kelt: Szekszárd, 2015.május 11.





7. melléklet

A pénzügyi elszámolás részletes szabályai

