



Iktatószám: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. szám alatt

Projekt azonosítószám: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírási jogosult képviselője: Fehér János igazgató, Grószné Kóczán Mónika irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Székhely/Lakcím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Azonosító szám (törzs-szám): 733568

Adószám/adóazonosító jel: 15733562-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11746005-15416566-11580001

Aláírási jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosító számon regisztrált, 2016.04.28. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2016.07.25. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a

Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt: Szekszárd, 2016 év augusztus hónap 10. napján.	 Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Szekszárd, 2016 év augusztus hónap 10. napján.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

1. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001
 Kezdeményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Energetikai tanúsvány készítése a beruházás megkezdését megelőzően.	1	45 000	12 150	57 150
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr szolgáltatás	1	500 000	135 000	635 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	monitor	2	34 400	9 288	87 376

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Irodai alkalmazások (szoftver)	2	56 400	15 228	143 256
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Operációs rendszer	2	38 400	10 368	97 536
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Háziorvosi szoftver	1	160 000	43 200	203 200
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Intel Pentium számítógép konfiguráció	2	89 900	24 273	228 346
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Fogorvosi rendelőbe eszközbeszerzés (sterilizáló, fogók, olló, tükrönyél, tükörszem, csipesz, szonda, klíma, laptop, multifunkciós nyomtató, rendelői bútor, várószékek, rendelőszékek, konyhaszék, forgószék rendelőbe)	1	2 209 189	596 481	2 805 670


2-716
Dompador

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék. A hiánypótlási kérelemben a személyi jellegű ráfordításoknál tervezett költség részletezésénél megbontásra került a létszám, bér és járulék adatokra, valamint a mennyiség sorban a foglalkoztatásban eltöltött hónapok száma került feltüntetésre. A megbontások miatt és a tizedesjegyek kerekítése miatt a korábbi költségvetéshez képest 7 forint különbség jelentkezett, melyet a tartalék sorra csoportosítottunk át.	1	2 362 210	637 797	3 000 007
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Az orvosi rendelőhöz eszközbeszerzés.	1	1 716 535	463 464	2 179 999
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyezési, kiviteli terv és rehabilitációs szakmérnök.	1	3 000 000	810 000	3 810 000

2

4
 Dörögdi

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Multifunkciós eszköz	1	36 500	9 855	46 355
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Nyomtató	3	25 400	6 858	96 774
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzs- ment költség	Projektmenedzs- ment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment járulékok. A járulékok elszámolása 3 főre értendő. A mennyiség sorban a hónapok száma lett megadva.	24	20 728	0	497 472
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés, bútortzat.	1	3 750 000	1 012 500	4 762 500


 3701
 Dapadu

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Meglévő épület átalakítása, bővítése. Szerkezetépítés, közműépítés. Épületgépészeti és épületvillamossági munkák, szakipari munkák, tetőszigetelés, nyílászáró csere, homlokzatszigetelés, belső burkolások. Gépészeti és elektromos szereplvényezések. Festés, mázolás.	1	39 500 000	10 665 000	50 165 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Napelemes rendszer kiépítése. Napelemes rendszer felszerelése, napelemek és inverterek elhelyezése, vezetékelések, mérőóracsere. E-ON általi beüzemelés.	1	1 000 000	270 000	1 270 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Nyilvánosság biztosítása	1	304 555	81 923	386 478
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Külső tér fejlesztése, udvar rendezés. Parkolók építése, fűvesítés.	1	4 800 000	1 296 000	6 096 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Fejlesztést követően energiatanúsítvány elkészítésének díja.	1	15 000	4 050	19 050
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárást meghirdető hirdetmény díja, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató díja	1	230 000	0	230 000



5
Dorpató

<p>SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</p>	<p>Projektmenedzs- ment költség</p>	<p>Projektmenedzs- ment személyi jellegű ráfordítása</p>	<p>Projektmenedzsment költség- bruttó bér. A bérköltség 3 főre értendő. A mennyiség sorban a hónapok száma lett megadva. A hiánypótlási kérelemben a személyi jellegű ráfordításoknál tervezett költség részletezésénél megbontásra került a létszám, bér és járulék adatokra, valamint a mennyiség sorban a foglalkoztatásban eltöltött hónapok száma került feltüntetésre. A megbontások miatt és a tizedesjegyek kerekítése miatt a korábbi költségvetéshez képest 7 forint különbség jelentkezett, melyet a tartalék sorra csoportosítottunk át.</p>	<p>24</p>	<p>56 043</p>	<p>0</p>	<p>1 345 032</p>
<p>ELŐSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</p>							<p>78.162.201,-</p>

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**
Kedvezményezett



[Handwritten signature]
Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2016. év augusztus hónap 10. napján. Kelt: Szekszárd, 2016 év augusztus hónap 10. napján.

6 *[Handwritten signature]*
Dorpatu

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	78.162.201,-
Összesen	78.162.201,-


 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.


 Kozreműködő Szervezet
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2016 év augusztus hónap 10.
 napján.

Kelt: Szekszárd, 2016 év augusztus hónap 10.
 napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.03.20.	Megalapozó dokumentum elkészítése, beszerzendő eszközök listájának összeállítása, energiatanúsítvány, fajlagos költségkimutatás. Tervezőt ki kell választani ahhoz, hogy az építési engedélyt megkaphassuk. Engedélyköteles beruházás esetén: a jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció. Tervezői költségbecslés elkészítése a beruházásra vonatkozóan. Rendezési terv módosítása, telekalakítást szükséges végezni.
2	2017.07.20.	Kiviteli terv, részletes tervezői költségvetés, tulajdonviszonyok rendezése
3	2018.01.20.	Közbeszerzés lefolytatása kivitelezésre és eszközbeszerzésre. Projektmenedzsment költség első részének elszámolása.
4	2018.04.20.	Beruházás 50%-os készültségi foka. Építési költségek és a műszaki ellenőri költségek első felének elszámolása. Szerkezetépítés, közműépítés.

5	2018.07.20.	Beruházás 100%-os készültségi foka. Épületgépészeti és épületvillamossági munkák, szakipari munkák, tetőszigetelés, nyílászáró csere, homlokzatszigetelés, belső burkolások. Gépészeti és elektromos szerelvényezések. Napelemes rendszer felszerelése, napelemek és inverterek elhelyezése, vezetékelések, mérőóracsere. E-ON általi beüzemelés. Festés, mázolás. Energiatanúsítvány elkészíttetése a fejlesztett ingatlanon. Eszközbeszerzés. Műszaki ellenőr, energiatanúsítvány elkészítésének elszámolása.
6	2018.09.03.	Eredményességmérési keret indikátor teljesítése. Nyilvánosság elszámolása.
7	2018.09.30.	A teljes projekt fizikai befejezése. Projektmenedzsment költség elszámolása.


 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kezeli/kezelte

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2016 év augusztus hónap 10. napján.


 Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2016 év augusztus hónap 10. napján.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001
 Kezdeményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7	Kórházban eltöltött napok számának a csökkentése	A korszerű egészségügyi alapellátás nemzetgazdasági érdek, célja a lakosság kórházban eltöltött napok számának a csökkentése. A népesség egészségi állapotának javítása.	3,00	nap	Kórházban eltöltött napok számának a csökkentése
7	Egészségügyi gondozók megtartása.	A javuló infrastruktúra megállíthatja az egészségügyi dolgozók elvándorlását. Külön csatolmányban olvasható az eredmény leírása.	1,00	orvos	Külön csatolmányban

Handwritten signature and date:
 2021.04.14
 Daryódy

7	Költség megtakarítás	Jelenős üzemeltetési költség takarítható meg, az önkormányzat hosszútávon biztosítani tudja az orvosi rendelők üzemeltetését	109.819 Ft	A fejlesztés CO megtakarítást eredményez, mely költségszökkenést produkál. A célérték az éves megtakarítást mutatja.
---	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

[Signature]
 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Képviseletének elnöke



[Signature]
 Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2016 év augusztus hónap 10. napján. Kelt: Szekszárd, 2016 év augusztus hónap 10. napján.

Dampochi



Magyarország Kormányzata
 Képviseletének elnöke

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001
 Kezdeményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltkozás	Cél kumulált
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2)		0	2018.09.30.	1,4000	1,4000	1,4000
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások (benne: háziorvos házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola és egészségügyi ellátás) száma:		0	2018.09.30.	2	2	2
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság		0	2018.09.30.	5328	5328	5328
Újoman épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma		0	2018.09.30.	1	1	1
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)		0	2018.09.30.	0	0	0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kezdeményező
 P.H.

Közreműködő Szervezet
 P.H.


Kelt Szekszárd, 2016 év augusztus hónap 10. napján.

Kelt: Szekszárd, 2016 év augusztus hónap 10. napján.


Darabos

**BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK,
MEGÁLLAPODÁSOK**

Alulírott Ács Rezső polgármester, valamint dr. Molnár Kata jegyző, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselői nyilatkozunk a „Szekszárd Megyei Jogú Város és Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. szám alatt című TOP-6.6.1-15 SE1-2016-00001 azonosítószámú projekttel kapcsolatban, hogy a 272/2014. Kormányrendelet 84. § alapján biztosíték nyújtása alól mentes SZMJV Önkormányzata.



.....
Ács Rezső polgármester



.....
dr. Molnár Kata jegyző
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata



Kelt Szekszárd

2016. év augusztus hónap 10. napján.



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

JELLEN SZERZŐDÉS ESETÉBEN NEM RELEVÁNS.

KÖZBESZERZÉSI TERV


Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Épület átalakítása, külső tér fejlesztése, udvar rendezés, napelemes rendszer kiépítése	45.300.000 Ft	Nemzeti eljárásrend kbt. 115 § szerinti nyílt eljárásrend	


 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.




 Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2016 év augusztus hónap 10.
 napján.

Kelt: Szekszárd, 2016 év augusztus hónap 10.
 napján.




RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A Wigand tér 1., IX. sz. felnőtt háziorvosi rendelő 2015. évi munkavédelmi ellenőrzésén Tolna Megyei Kormányhivatal hiányosságokat állapított meg, kötelezte az Egészségügyi Gondnokságot a munkahelyen foglalkoztatott, biológiai kóroki tényezőknek kitett munkavállalói számára öltöző, étkező, valamint zuhanyzó biztosítására. Ezen fejlesztésekre, továbbá a betegek részére pedig egy új akadálymentes WC helyiség - szükség esetén az épület bővítésével történő – kialakítására a pályázat lehetőséget biztosít. Az ingatlan háziorvosi alapellátáson túl fogorvosi rendelőnek is helyt ad, ezáltal több funkció is fejleszthető. Az előzetes elképzelések alapján a fogorvosi rendelőhöz független bejárat és akadálymentes WC helyiség, továbbá a munkavállalók részére étkező, öltöző és zuhanyzó kerül kialakításra. Az érintett ingatlanrészeken tetőfelújítás, külső homlokzat felújítás és a nyílászárók cseréje készül. Az elöregedett víz- és szennyvízvezetékeket is cserélni kell, az elektromos rendszer teljes átalakítása szükséges. A tetőre napelemes rendszer lesz telepítve, mely biztosítani fogja a rendelő teljes villamos energia szükségletét. A fűtési rendszert korszerűsíteni kell a két rendelő fűtési rendszerének szétválasztásával. A meglévő megmaradó vizesblokkok teljes átalakítása, felújítása szükséges. Az elhasználdott burkolatok helyett új fal és padlóburkolatok készülnek. A bejáratok akadálymentes megközelítésére rámpák készülnek. A bővítéshez a telek kiegészítésére is szükség lesz. Az udvar rendezése során a rendelőkhöz új parkolók, illetve akadálymentes parkoló is épül. Az átalakított, kibővített rendelővel alapterületi egységre vetítve jelentős üzemeltetési költség takarítható meg, az önkormányzat hosszútávon biztosítani tudja az orvosi rendelők üzemeltetését. A korszerű egészségügyi alapellátás nemzetgazdasági érdek, célja a lakosság kórházban eltöltött napok számának a csökkentése. A népesség egészségi állapotának javítása, a várható élettartam, ezen belül az egészségben eltöltött évek számának a növelése. A javuló infrastruktúra megállíthatja az egészségügyi dolgozók elvándorlását.

Szekszárd, 2016. augusztus 10.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

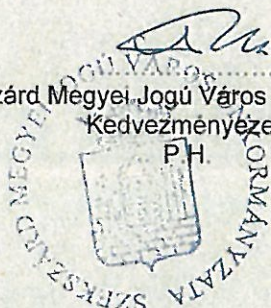

[Handwritten signature]
Dancsó

PROJEKT HELYSZÍNE

7100 Szekszárd, Wigand tér 1-2.

Szekszárd, 2016. augusztus 10.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett



[Handwritten signature]
1 *[Handwritten mark]*
Doropodu

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 78.162.201.- Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	x
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1-4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		x
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése		x
5	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		x
6	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
7	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	"C"	
8	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
9	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
10	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
11	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
12	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
13	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
14	A beruházás helyszínén "B" vagy "D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése		x

Kelt: Szekszárd, 2016. augusztus 10.

Kedvezményezett képviselő aláírása
Ács Rezső
 polgármester

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

JELEN SZERZŐDÉS ESETÉBEN NEM RELEVÁNS.

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVEKÉNYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

13. sz. melléklet

Költség típus	Megnevezés	Finanszírozás módja
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Energetikai tanúsítvány készítése a beruházás megkezdését megelőzően.	Utófinanszírozás
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr szolgáltatás	Utófinanszírozás
Eszközbeszerzés költségei	monitor	Utófinanszírozás
Immateriális javak beszerzése	Irodai alkalmazások (szoftver)	Utófinanszírozás
Immateriális javak beszerzése	Operációs rendszer	Utófinanszírozás
Immateriális javak beszerzése	Háziorvosi szoftver	Utófinanszírozás
Eszközbeszerzés költségei	Intel Pentium számítógép konfiguráció	Utófinanszírozás
Eszközbeszerzés költségei	Fogorvosi rendelésre eszközbeszerzés (sterilizáló, fogók, olló, tükrönyél, tükrörszem, csipesz, szonda, klíma, laptop,	Utófinanszírozás




Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



1
Dorpató

	multifunkciós nyomtató, rendelői bútor, városzékék, rendelőszekék, konyhaszék, forgószék (rendelőbe)	
Eszközbeszerzés költségei	Multifunkciós eszköz	Utófinanszírozás
Eszközbeszerzés költségei	Nyomtató	Utófinanszírozás
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment járulékok	Utófinanszírozás
Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés, bútortzat	Utófinanszírozás
Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás
Eszközbeszerzés költségei	Az orvosi rendelőhöz eszközbeszerzés.	Utófinanszírozás
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyezési, kiviteli terv és rehabilitációs szakmérnök.	Utófinanszírozás
Építéshez kapcsolódó költségek	Meglévő épület átalakítása, bővítése. Szerkezetépítés, közműépítés. Épületgépészeti és épületvillamosság munkák, szakipari munkák, tetőszigetelés, nyílászáró cseré, homlokatszigetelés, belső burkolások. Gépezeti és elektromos szerelvényezések. Festés, mázolás.	Utófinanszírozás
Építéshez kapcsolódó költségek	Napelemes rendszer kiépítése. Napelemes rendszer felszerelése, napelemek és inverterek elhelyezése, vezetékelések, mérőóracsere. E-ON általi beüzemelés.	Utófinanszírozás
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Nyilvánosság biztosítása	Utófinanszírozás
Építéshez kapcsolódó költségek	Külső tér fejlesztése, udvar rendezés. Parkolók építése, füvesítés.	Utófinanszírozás

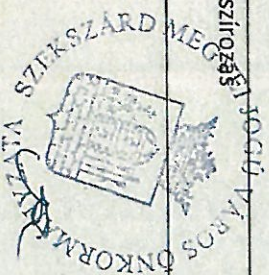

2
Dobos

Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Fejlesztést követően energiatanúsítvány elkészítésének díja.	Utófinanszírozás
Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárást meghirdető hirdetmény díja, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató díja	Utófinanszírozás
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment költség- bruttó bér	Utófinanszírozás

Szekszárd, 2016. augusztus 10.


 Szekszárd Megyei Igású Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.







EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

JELLEN SZERZŐDÉS ESETÉBEN NEM RELEVÁNS.




1 
Dávid

